



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -



OFÍCIO Nº 533/2023

Em 10 de Março de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 2361/2023 **de 13/03/2023 13:25**

Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 67/2023

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA


Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 67/2023**, de autoria do Vereador **LINEU CARLOS DE ASSIS**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OFÍCIO Nº CEOP 017/2023

Araraquara, 03 de março de 2023.

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Ref: Requerimento nº 067/2023.

Cumprimentando lhe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado, sirvo-me do presente para esclarecer o que segue.

Trata-se do **contrato nº 5478-2021**, oriundo do PROCESSO ADMINISTRATIVO: 868/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE NOVA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO OURO, LOCALIZADA NA ARA50 – ESTRADA ABÍLIO AUGUSTO CORREA, NO BAIRRO DOS MACHADOS, com **Ordem de Serviço emitida em 02 de julho de 2021** com prazo de execução de 180 dias corridos, ou seja 29/12/2021.

Na segunda quinzena de **agosto de 2021**, durante a execução da etapa inicial da obra, mais especificamente no planejamento de execução das estacas da nova ponte, foi identificada a necessidade de realizar o desvio dos dutos da Cutrale, onde pela proximidade com a rede poderia ocorrer o rompimento daquela tubulação tornando temerária a execução das estacas com possíveis prejuízos ao meio ambiente e à indústria. Momento no qual a Secretaria de Obras realizou reunião presencial com a Cutrale a fim de averiguar quanto à destinação da tubulação existente, bem como de apresentar o projeto de execução da nova ponte.

Diante das informações apresentadas e do devido estudo de caso a Cutrale protocolou já em **26/08** o **Guichê 51.697/2021** formalizando o pedido de paralização da obra para a execução do desvio da tubulação, com prazo estimado de 90 dias, quando o Município efetuou a necessária **suspensão do contrato por 120 dias**, conforme estipula a Lei 8.666/1993. Porém a Cutrale protocolou em **20/10**, sob **guichê nº 65.154/2021** comunicado informando a antecipação da obra e conclusão dos serviços.

Restava ainda a execução dos serviços da concessionária de energia **CPFL Paulista**, realocação dos postes e rede de energia, os quais foram solicitados em **09/08/2021**, gerando o **Protocolo/Atividade nº 0809779001**, e que foram concluídos em **15/11/2021**, conforme contato telefônico da concessionária, assim o Município solicitou a **retomada da obra em 25/11/2021**.

Com a retomada das obras, após a mobilização inicial bem como a execução de serviços preliminares, foi providenciada a **“Ocupação Temporária”** através do **DECRETO Nº 12.800, DE 26 DE JANEIRO DE 2022**, em virtude de as tratativas com o particular



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

terem se mostrado lentas e ineficientes. Somente após a aplicação do poder de império foi possível a efetiva demolição da ponte.

Todavia, apesar dos esforços da municipalidade em executar as obras necessárias, a retomada se deu ainda no período de chuvas, o que prejudicou em muito o andamento dos serviços. Por diversas vezes os serviços foram interrompidos por conta do volume da água que chegou ao nível da pista, conforme imagem abaixo retirada de registro em vídeo.



Ocorreu ainda caso em que o operador da máquina que trabalhava no leito do rio precisou abandonar o equipamento por conta da cheia repentina ocasionada por chuvas na região, conforme mostra registro fotográfico abaixo:



Escavadeira hidráulica tomada por resíduos e detritos após a cheia repentina do rio em **17/03/2022**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Em 30/03/2022, esta Secretaria notificou a empresa em virtude do ritmo da obra, a qual apresentou defesa em 02/04/2022 se justificando pelas dificuldades com a pandemia, chuvas, bem como custo dos insumos em virtude da situação de guerra entre a Rússia e Ucrânia. Ainda assim independente dos fatores alegados se comprometeu, pelo período de estiagem, em se empenhar para a conclusão na maior brevidade possível.

Em meados de agosto a obra não demonstrou bom ritmo e a empresa foi chamada para tratativas onde em 06/09 o representante da empresa esclareceu ao Secretário de Obras e à Secretária de Governo, Planejamento e Finanças que aguardava a entrega de estacas pré-moldadas necessárias para fundação das cabeceiras da nova ponte e para a continuidade dos serviços.



O referido contrato é oriundo do **Convênio Estadual nº 363/2020-SDR-PRC-2020/00823**, com valor de repasse **R\$ 2.140.428,92** e contrapartida de **R\$ 68.992,44**, perfazendo um total de **R\$ 2.209.421,36** com início em 14/08/2020 e vigência de 720 dias. A respectiva **Ordem de Serviço** foi emitida em **02/07/2021**, porém o repasse da primeira parcela dos recursos estaduais, no valor de R\$ 300.000,00, se deu em **02/03/2022**.

No decorrer da obra foram efetuadas quatro medições, que consumiram a totalidade da primeira parcela de repasse e o **total da contrapartida municipal**, restando em aberto o valor de **R\$ 93.690,06**.

MEDIÇÕES REALIZADAS	DATA DE PROTOCOLO	VALOR DA NOTA FISCAL	PERCENTUAL DA OBRA
1ª MEDIÇÃO	09/02/2022	R\$ 156.443,68	7,08%
2ª MEDIÇÃO	26/05/2022	R\$ 78.981,42	3,57%
3ª MEDIÇÃO	07/07/2022	R\$ 121.872,00	5,52%
4ª MEDIÇÃO	21/07/2022	R\$ 105.385,40	4,77%
TOTAL		R\$ 462.682,50	20,94%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Neste interim o Município iniciou as tratativas referentes ao repasse e também quanto à prorrogação do convênio tendo em vista a demora do repasse das parcelas. **Tais tratativas foram concluídas pelo estado em 16/09/2022**, com o envio do **Termo Aditivo do Convênio, prorrogando sua vigência em mais 720 dias** ficando seu término para **24/07/2024**.

Em visita ao local da obra nos dias 05/10 e 06/10 foi verificada a presença da empresa e efetiva continuidade dos serviços com a retirada de árvores e de enrocamento dos taludes conforme fotos abaixo:



Segundo a empresa, em virtude de atraso de fornecedores as estacas foram efetivamente entregues somente em 15/12/2022.

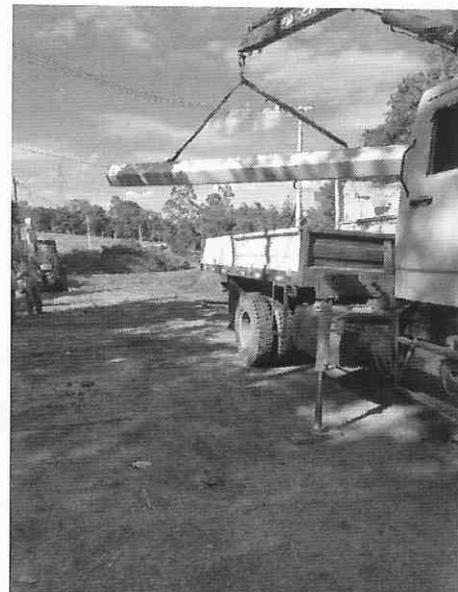




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Em vistoria recente, realizada em 30/01/23, foi constatada a realização da cravação das estacas.

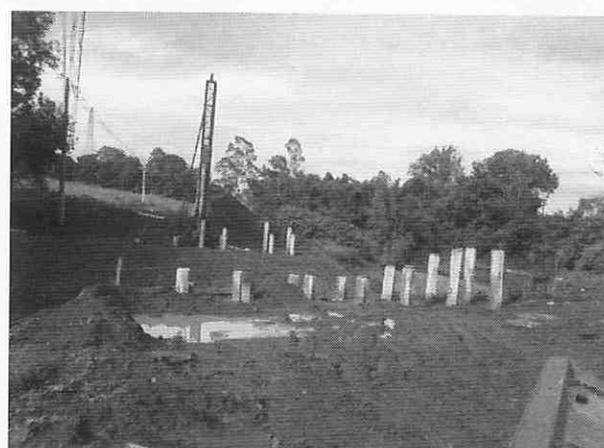

Nestes comenos houve três novas medições de 5ª à 7ª, somando R\$ 129.132,44 que junto aos R\$ 93.690,06 da 4ª medição perfazem um total, a receber, de R\$ 222.822,50 a favor da empresa, que, como o Município, aguarda o crédito do repasse do Estado.

MEDIÇÕES REALIZADAS	DATA DE PROTOCOLO	VALOR DA NOTA FISCAL	PERCENTUAL DA OBRA
1ª MEDIÇÃO	09/02/2022	R\$ 156.443,68	7,08%
2ª MEDIÇÃO	26/05/2022	R\$ 78.981,42	3,57%
3ª MEDIÇÃO	07/07/2022	R\$ 121.872,00	5,52%
4ª MEDIÇÃO	21/07/2022	R\$ 105.385,40	4,77%
5ª MEDIÇÃO	10/11/2022	R\$ 8.058,60	0,36%
6ª MEDIÇÃO	25/11/2022	R\$ 39.294,53	1,78%
7ª MEDIÇÃO	20/12/2022	R\$ 81.779,31	3,70%
TOTAL		R\$ 591.814,94	26,97%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

O processo para o efetivo repasse tramita junto ao Estado com a finalidade de viabilizar o repasse da segunda parcela no valor de R\$ 200.000,00 conforme previsto no cronograma físico-financeiro do convênio.

Em vistoria à obra, em 09/02/2023, foi constatado a ausência de equipes de execução da empresa no local, bem como foi constatado pouca, ou nenhuma, evolução desde 30/01, ensejando notificação à empresa que apresentou defesa, cujo processo encontra-se tramitando junto à Gerência de Contratos da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Quanto à reequilíbrio e cópias dos termos formalizados, sugiro encaminhamento à Gerência de Contratos da Secretaria de Planejamento e Finanças.

Sendo o que tínhamos a colaborar, despedimo-nos com votos de estima e distinta consideração.

Cordialmente;

Sérgio José Pelicolla
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
